



外部 Agent 执行工作包

 测试矩阵

 P0 验收演示脚本



这是给外部 Agent 的完整执行包。与  Agent 协作章程·书影计划 v6 一起使用:协作章程 负责「怎么处事」,本包 负责「具体做什么 / 怎么开始」。

如果你是 Agent,请按 §0 顺序读完后再动手。如果你是 Joel,这页是委托任务时发给 Agent 的入口。

TL;DR

本包含 **10 个子页**,覆盖 P0(MVP)阶段从环境 → 代码骨架 → **数据模型定顿** → 文案 i18n → 验收脚本 → 测试矩阵的全部可执行输出。外部 Agent 读完这 10 页 + 协作章程 + v6 主文档 + 中 ADR-049 / 050 / 051,可独立推进 P0 20 任务。

§0 入场指引(读取顺序)

Agent 首次上任,严格按下述顺序读取,不跳步:

1. 先读  Agent 协作章程·书影计划 v6(意识形态 + 不变量 + 汇报格式)
2. 再读  个人书影剧库平台产品方案 v6 §1、§2、§12(愿景 + 架构 + 48 ADR)
3. 本页 §1 总览 → §2 上手流程 → §3 阶段目标
4. 打开  P0 任务清单(20 步实例化) +  P0 环境与凭据 checklist,开始 Task 01
5. **写 migration 前(Task 03 起)** → 通读  DB Schema v1.0.0 设计,按此页一次性产出全部 P0 表;偏离必走 ADR 修订
6. 遇到疑点 →  ADR 48 条快查索引 + (含 ADR-049/050/051) 反查;不同意某条 ADR → 按协作章程 §6 走「ADR 修订流程」

§1 工作包总览

#	子页	作用
1	 P0 任务清单(20 步实例化)	20 步以任务卡形式拆解,包含依赖图、验收、输出交付物
2	 P0 环境与凭据 checklist	SaaS 账号、环境变量、本地开发、CI 领域准备
3	 ADR 48 条快查索引	10 主题分类的决定快查表,召回决策上下文
4	 项目骨架与代码规范	仓库结构、SQL/RLS/pgTAP/TS 模板、Commit/PR 规范、CI 要点
5	 MSPF v1.0.0 JSON Schema	导出/导入的 schema 草案 + 校验工具 + SemVer 规则
6	 Media Type Registry 配置(book + movie)	Registry 类型、book/movie 实例、扩展指引
7	 i18n key_bundle 雏形	zh-CN + en-US bundle 骨架、命名规范、文案风格
8	 P0 验收演示脚本	P0 GO/NOT-GO 唯一判准,13 步走通 + 3 项红线验证
9	 测试矩阵	分层覆盖表、RLS 三角色模板、红线专项、CI 必畴集
10	 DB Schema v1.0.0 设计	P0 所有表、字段、ER 图、RLS 全表矩阵的 canonical 定顿(Task 03 migration 必读)


§2 Agent 上手流程


flowchart TD


```

A[入场：读协作章程] --> B[读 v6 主文档 §1/§2/§12]
B --> C[读本页 §0-§4]
C --> D[读任务清单 Task 01]
D --> E[起动环境 checklist 核对]
E --> F{凭据/决策需 Joel 确认?}
F -- 是 --> G[按章程 §10 升级,用 5 段式汇报]
F -- 否 --> H[按任务卡执行]
H --> I[提交 PR / migration / ADR 草案]
I --> J{Task DoD 达成?}
J -- 是 --> K[汇报 + 推进下一 Task]
  
```

J -- 否 --> H
G --> H



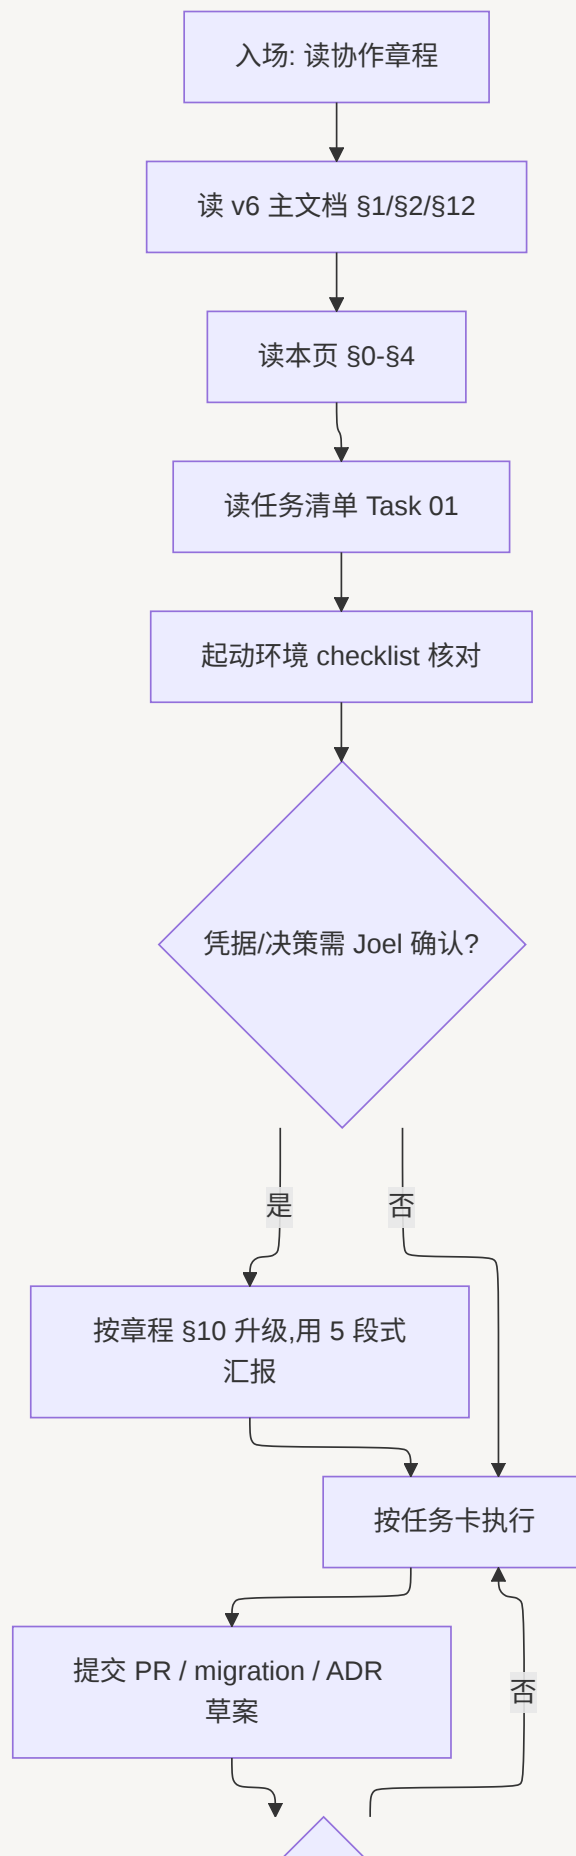

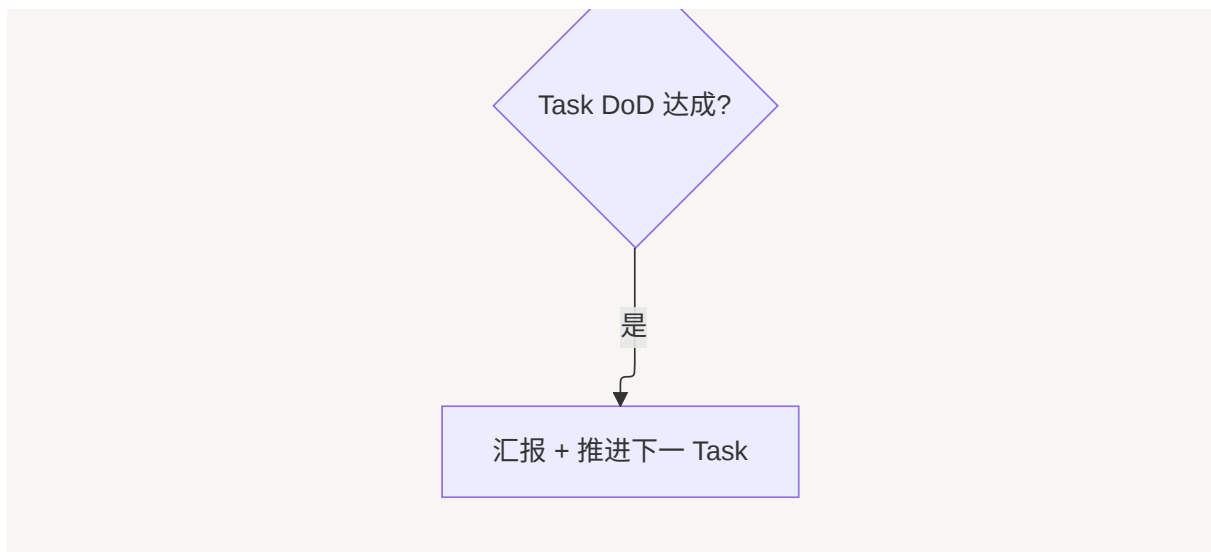

§2.1 Task 01 开工前必须确认

Agent 动手写代码前,逐项勾选(任一未达成 → 走§10 升级,不要「先试试看」):

- ☐ 已读完 📖 Agent 协作章程 · 书影计划 v6
- ☐ 已读 📖 个人书影剧库平台产品方案 v6 §1 / §2 / §12(48 ADR)
- ☐ 已读 📋 P0 任务清单(20 步实例化) 概览 + Task 01 卡面
- ☐ 已根据 🛠️ P0 环境与凭据 checklist 逐项核对本机环境
- ☐ Node ≥ 20、pnpm、Git、Docker 可用; `pnpm -v` 与 `docker info` 返回正常
- ☐ Supabase dev 项目可访问(能连上、能跑 migration)
- ☐ `.env.example` 已填齐,本地 `.env.local` 已复制出来但仅含 dev 密钥
- ☐ 明确本任务提交渠道(PR 到 dev / feature 分支 — 不直推 main)
- ☐ 所有 **production keys** 不出现在本地环境(`grep -r SUPABASE_SERVICE_ROLE .env.local` 为空)
- ☐ 已明白本页 §6 权限边界与 §13 安全红线

§3 阶段交付目标

阶段	交付状态	关键输出
P0	MVP 可用	书/电影加入与记录、Top-3、公开主页、MSPF 导出、注销
P1	体验趋完备	质量状态、进度可见、费曼式复盘 / 年度回顾雏形、Provider Adapter 完善

阶段	交付状态	关键输出
P2	社交中饱和	Following 动态、Lists、Reading Goals(实验)、Annotations UI
P3	生态拓展	TV/音乐作为 Registry 验证、推荐「Slow Companions」
P4	可持续	联邦探索、MSPF v2 预热、提设 Federated Memory

本包详细覆盖 P0;P1+ 仅在 ADR / v6 顶层架构中预留打点。

§4 核心引用

-  [个人书影剧库平台产品方案 v6](#)
-  [Agent 协作章程·书影计划 v6](#)(意识形态 + 不变量 + DoD + 汇报格式)
- [书影剧项目任务看板](#)(Task 状态追踪)
- (新 ADR 写入·**新增 ADR-049 work 去重 / ADR-050 entry-edition 基数 / ADR-051 观测性基线**)
-  [DB Schema v1.0.0 设计](#)(P0 运行时表结构 canonical 定帧)

§5 不在本包内·需 Joel 提供

Agent 不能自行产出的东西,遇到后按协作章程 §10 升级:

- **品牌与视觉**:logo、配色、品牌名、使用条款/隐私政策文案同意
- **生产凭据**:所有 SaaS 的 production keys(环境 checklist 中标 需 Joel)
- **设计稿**:dashboard / public profile / library 高保真(P0 可用 shadcn 默认 + 手选颜色)
- **法律决策**:GDPR/CCPA 增加要求、DPO 联系人、平台部署区域合规判断

以上由 Joel 手动交付后,Agent 才能推进对应 Task。

 [P0 环境与凭据 checklist](#)

 [ADR 48 条快查索引](#)

§6 Agent 权限边界

- **可执行(无需 Joel 单独授权)**
 - dev / staging 分支代码、migration 草案、ADR 草案、文档草案、测试

- 在 书影剧项目任务看板 更新本任务状态与备注
- 在 提 ADR 草案(状态=Proposed)
- 调用 dev / staging 环境的 SaaS
- **必须升级(走章程 §10)**
 - 修改 v6 §3 不变量、或 Accepted 状态的 ADR
 - 调整 P0 范围(新增 / 移除 / 调换任务)
 - 引入付费 SaaS、新依赖(成本或合规风险)
 - 修改公开主页可见性边界(可见字段 / 匿名路径)
- **禁止(直接拒绝)**
 - 操作 production 数据库或使用 production secret
 - 删除已 Accepted 的 ADR
 - 关闭或绕过 RLS、删除 RLS 测试
 - 绕过 CI 必跨项(typecheck / pgTAP / schema / migration smoke)
 - 提交真实用户数据作为 fixture
 - 前端代码暴露 service role key

§7 阻断项与可替代项

区分哪些缺失卡死开工、哪些可 mock 继续:

-  **阻断项**(任一缺失 → 停工 + 走 §10 升级)
 - Supabase dev 项目访问与 anon / service key
 - GitHub repo write + dev 分支创建权限
 - Vercel 项目接入(预览部署)
 - 本地 Node ≥ 20 / pnpm / Docker
 - v6 主文档、协作章程、本工作包访问权限
-  **非阻断 · 可 mock**
 - 品牌名 / logo / 配色(P0 占位即可,Joel 后续替换)
 - 高保真设计稿(用 shadcn/ui 默认 + Tailwind 自然色)
 - 隐私政策 / 使用条款正式文案(占位文本,标 [TBD])

- production keys、正式域名(P0 不需)
- 第三方 Provider 配额(可先用 mock provider)
- **阻断项登记格式**(遇到时写入, type=Risk):
 - 阻断项 / 影响的 Task / 期望由谁解除 / 已尝试的替代方案

§8 Agent 交付与汇报格式

严格遵循协作章程 §5.4 五段式汇报。本页仅给**操作版极简模板**(字段一一对应章程):

```
## Task <编号> · <标题> · 交付汇报

### 1) 完成
- 改动文件 / migration / 测试 / 文档(列点)

### 2) 关键变更
- 是否触及 ADR / 不变量 / public surface

### 3) 验证
- typecheck / lint / unit / pgTAP / schema / migration smoke 各项结果
- 红线测试(如适用)

### 4) 风险与待确认
- 阻断项 + 走 §10 升级的诉求
- 已用 mock 的项

### 5) 下一步
- 推荐进入的 Task 编号 + 前置依赖是否就绪
```

每次交付必须附:PR / patch 链接、ADR 草案链接(如有)、任务看板状态更新。

§9 代码任务最小 DoD(操作清单)

章程 §7 DoD 偏意识,本页给操作清单。**所有代码任务**标 Done 前逐项勾选:

- ☐ `pnpm typecheck` 本地通过
- ☐ `pnpm lint` 本地通过
- ☐ `pnpm test` 单测通过

- ☐ `pnpm db:migrate:smoke` 在 ephemeral pg 上通过
- ☐ 含 RLS 表 / view 改动:pgTAP 三角色(owner / other / anon)全过
- ☐ 含 MSPF schema / 导出路径改动:ajv 校验通过
- ☐ 无 production secret 入仓(`gitleaks` 扫描)
- ☐ 未删除 / 关闭已有测试(如有正当理由 → 写 ADR)
- ☐ 任务看板状态已更新
- ☐ 五段式汇报已填好

数据库任务额外:

- ☐ migration 命名 `YYYYMMDDHHMM_<verb>_<noun>.sql`
- ☐ audit 7 字段(ADR-019)齐全
- ☐ 软删除字段(如适用)
- ☐ 索引、约束、外键齐全

§10 单一事实源与冲突处理

文档冲突时优先级(高 → 低):

1. 📖 Agent 协作章程 · 书影计划 v6(意识、不变量优先级、汇报格式)
2. 📘 个人书影剧库平台产品方案 v6 §3 不变量 与 §12 Accepted ADR
3. 本工作包 + 10 子页(P0 操作层),其中 📄 DB Schema v1.0.0 设计 为 P0 运行时表结构 canonical 定顿,Task 03 migration 不得偏离
4. 书影剧项目任务看板 中的 Task 描述
5. 临时讨论 / chat 记录

冲突处理:

- **不允许 Agent 自行裁决**
- 走章程 §6 ADR 修订流程(新 ADR 草案 Proposed → Joel 评估 → Accepted / Rejected)
- 如急于推进 → 在「决策日志」开 ADR 草案 + 任务看板中 Block 该 Task 并 @Joel

§11 P0 关键路径(压缩)

完整 20 步与依赖图见  P0 任务清单(20 步实例化)。此处仅给压缩链路:

环境 → 骨架 → DB migration → RLS pgTAP → Registry → Provider Adapter → 作品/条目 → 进度/笔记 → Dashboard → 公开主页 → MSPF 导出 → 注销 → P0 验收

任何 Task 不得绕过:migration、RLS、ADR 引用、最小 DoD。

§12 失败处理协议

Agent 遇到失败,不得静默跳过。必须输出:

- 失败发生在哪一步(Task 编号 + 文件 / 命令)
- 复现命令与最小复现集
- 错误日志摘要(< 50 行)
- 已尝试的 ≥ 1 个修复及结果
- 判定:阻断 / 非阻断
- 期望 Joel 提供什么 / 是否需新 ADR

禁止行为(任一即视为越权):

- 删测试 / `.skip` / `.only` 绕过失败
- 临时关闭 RLS 或改用 service role 绕过权限
- 把 production key 写进代码 / `.env` 提交
- 静默吞掉异常(`catch { /* ignore */ }`)
- 改业务代码去适配错的测试预期

§13 安全红线

任一触发即视为越权 + Task 立即作废 + 需新 ADR 复盘:

- 将 `private_note` 暴露到公开主页 / SSR HTML / Server Action 响应 / `__NEXT_DATA__`
- 将 service role key 放入前端代码或提交到仓库
- 绕过 RLS 读取其他用户数据
- 使用真实用户数据作为测试 fixture
- 日志 / 错误上报 / Sentry 中打印用户 private 字段
- 导出他人 MSPF 数据
- 公开主页 view 关联到 `private_activity_log` / 任何 `private_*` 表

- 未经 Joel 单点确认调用 production 的 destructive operation(DROP / DELETE / TRUNCATE)

红线触发时,Agent 必须立即停止当前 Task,回滚改动,在「决策日志」新增 Incident 条目并 @Joel。

§14 子页列表

 [PO 任务清单\(20 步实例化\)](#)

 [Media Type Registry 配置\(book + movie\)](#)

 [MSPF v1.0.0 JSON Schema](#)

 [项目骨架与代码规范](#)

 [i18n key bundle 雏形](#)

 [DB Schema v1.0.0 设计](#)
